

LANDBRUK

MASKINAKTIESELSKAP

FLORØAVDELING

DISP. M. H. A. STANDAL

MASKINER - RØR - JERN - STÅL
METALLER - STØPEGODS - CEMENT
PAPP-BYGNINGSARTIKLER-OLJER

SAGBRUKSARTIKLER
SY- & STRIKKEMASKINER
ELEKTRISKE APPARATER
MEIERI & KJØLEMASKINER

S/S.

FLORØ, den 29. januar 1940.
(NORWAY)

TELEGRAFADRESSE: LANDBRUK

TELEFONER:

MASKINAVD. OG STANDAL PRIVAT NR. 10	
JERNAVDELING OG EKSP.	128
JERN- OG MASKINLAGER	80
STANDAL PRIVAT	12

Overlæge Th. Pettersen,

Lunggårdens sykehus, Bergen.

Ad. Lavik Helseheim.

anvisning på

kr. 5.000.-,


som vi takker for.

Jeg har mottatt Deres brev av nevnte dato med
Med hensyn til spørsmålet om å få arbeidet utført i hurtigere tempo såmeddeles at hvis vi kan få komme frem skal vi sende ytterligere 2 mann for å få arbeidet gjort i en fart. Vi hadde nemlig regnet med at vi skulde være ferdig med dette innen 3 uker måneder efter at vi begynte på arbeidet. Og det har også vært forsøkt å forsere arbeidet frem, men det har vist sig umulig å komme frem. Vi er klar over at byggmesteren vil legge skylden på oss, men til denne tid har det vært uhyre vanskelig å komme frem.

I anledning av at rørleggerne venter på materialer meddeles at når vi får en telefonordre blir varene ekspedert herifra på dagen. Har vi ikke varen på lager henvender vi oss telefonisk til en av våre forbindelser i Bergen, Brødrene Dahl A/S, eller andre og vi har bedt om at varene måtte sendest med første båt. Men enkelte varer har heller ikke firmaene i Bergen hatt på lager og i slike tilfelle r har man måttet like til Oslo.


De forskjellige ekstraarbeider som skulde gøres, har rørleggerne heller ikke kunnet ta fatt på idet det har manglet rekvisisjon og beskjed fra komiteen eller arkitekten. Dette gjelder blandt annet 2 rustfrie vasker som man først i det siste har fått avgjort. Dessuten har det vært tale om noen vasker som vi har gitt tilbud på og spørsmålet er om vi ikke kunde få denne sak avgjort, slik at vi kunde få bestille vaskene og få gjort det forberedende arbeidet som skal til i denne forbindelsen. Skal dette ikke leveres, vilde vi gjerne få beskjed om det.

Vi kommer til å gi beskjed til rørlegger Lar-



ARK 2 TIL overløge Th. Pettersen, Bergen.

sen, som for öieblikket er i Leikanger for å avlevere et anlegg vi har hatt der inne, at han må reise til Lavik og vi går ut fra at byggekomiteen vil ordne det slik at våre folk kan slippe å vente på andre. Det koster jo oss en masse panger og har allerede kostet oss mer penger enn vi hadde kalkulert med, som skyldes at våre planer for arbeidet er blitt kulkastet gang på gang.

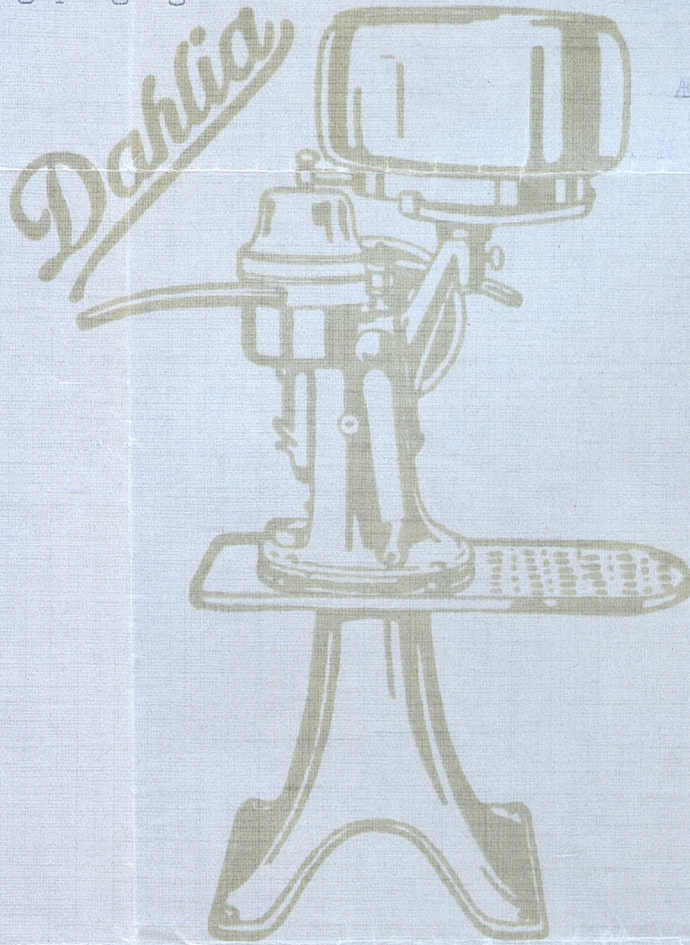

Arbeidsgst

Lund

LANDBRUK
